

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		E
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com		er0407@ho
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA O				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
Total Autorizado		12,114,460.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.


FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
-88-05	
tmail.com	

BRA	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																					
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS	
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
Dirección Postal completa																											
			X			21	1	2					1					1		1					2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0

FOTOS ACTUALES

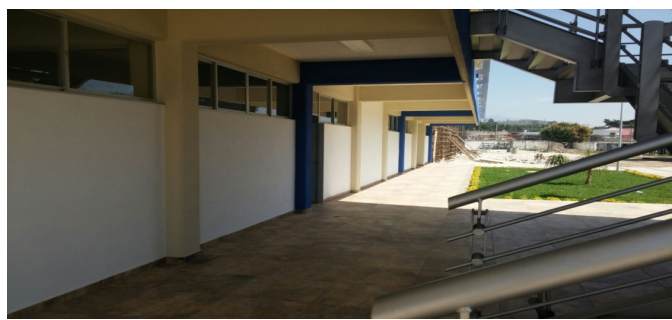

TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2018.

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo:	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono:	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico:	amcape@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
Clavelnst911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centa)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada			
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	200,000.00		100%									SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA) CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FLOSOFIA CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85					674	1220	1894			18/07/16	25/07/16			
	Total	200,000.00	200,000.00	0.00																													

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016
 INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2018.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN	ARO. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Entidad federativa:	NAYARIT	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
ClaveInst 911	18MSU0019M	Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800 8638
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIAI										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos											
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centa.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total		
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%					X					X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO										184	358	542
Total		118,563.84																													

OBSERVACIONES	
La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.	
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa. del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94	
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94	
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO	
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.	
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.	

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																							
Especificar	TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctva.)
	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctva.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
	0	0.00																																		0	0.00		
	0	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00		
